



**Seguimiento a ejecución presupuestaria y eventos de compra  
durante la emergencia COVID-19**

**04 de junio de 2020**

## Contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. Hallazgos .....  | 3  |
| 1.1 Sobre la ejecución presupuestaria.....  | 3  |
| 1.2 Sobre los procesos de compras y adquisiciones en modalidad de excepción .....   | 3  |
| 2. Recomendaciones.....   | 4  |
| 3. Seguimiento a ejecución de presupuesto .....   | 6  |
| 3.2 Ejecución física.....   | 8  |
| 3.3 Ejecución presupuestaria del MSPAS y sus unidades ejecutoras.....   | 10 |
| 4. Seguimiento a eventos de compra por excepción por emergencia COVID-19 del MSPAS.   | 13 |
| 4.1 Eventos de compra por unidad ejecutora del MSPAS .....  | 16 |
| 4.2 Departamento Administrativo MSPAS -unidad ejecutora 201- .....  | 17 |
| Anexo 1. Presupuesto vigente y ejecutado por el MSPAS para la atención de la “Emergencia COVID-19”, según unidad ejecutora .....  | 19 |
| Anexo 2. Eventos publicados y adjudicados por el MSPAS para la atención de la “Emergencia COVID-19”, según unidad ejecutora ..... | 22 |

# 1. Hallazgos

## 1.1 Sobre la ejecución presupuestaria

- A casi tres meses de haberse declarado el estado de calamidad por la emergencia de COVID-19, que conllevó la correspondiente flexibilización en las normas de adquisiciones y contrataciones, y a más de dos meses de que el Congreso de la República aprobó las ampliaciones presupuestarias para la atención de esta emergencia, la mayoría de las entidades aún reflejan bajas ejecuciones, aunque algunas ya empiezan a acelerar el proceso de ejecución.
- El 28 de mayo 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) operó las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República, a través del Decreto 20-2020, dentro de las cuales se contemplan el bono de riesgo para personal de salud expuesto al COVID-19 (Q 26 millones) y para la compra de ventiladores, pruebas, trajes y materiales de equipo de protección personal (Q 370 millones)
- A más de tres meses de haberse declarado la emergencia el MSPAS ha ejecutado únicamente el 2.6% de los Q 1,675.8 millones disponibles para atender esta situación; entre el 18 de mayo y el 02 de junio, la ejecución presupuestaria de esta cartera pasó de Q 14.9 millones a Q 43.7 millones, es decir que casi triplicó la ejecución en un periodo de 15 días.
- La mayor parte de las unidades ejecutoras del MSPAS, tanto a nivel central (unidad ejecutora 201- Departamento Administrativo) como en las unidades descentralizadas (áreas de salud, hospitales, etc.), presentan ejecuciones por debajo del 10%, situación que también afecta los cinco hospitales temporales, que en conjunto únicamente han ejecutado el 1.37%.

## 1.2 Sobre los procesos de compras y adquisiciones en modalidad de excepción

- El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publicó el 16 de mayo de 2020 el concurso para la adjudicación del Contrato Abierto 3-2020, con el NOG 12385220, evento que fue solicitado por el MSPAS para la compra de equipo de protección para personal de salud. Concretar este contrato abierto permitiría agilizar la adquisición de este tipo de insumos por parte del MSPAS. El 26 de junio de 2020 se cierra la recepción de ofertas, ese día el MINFIN ha invitado al público en general a participar como observadores en la apertura de plicas de este concurso.

- El MSPAS ha publicado 4,749 eventos de compra relacionados con la emergencia COVID-19, de los cuales el 81% corresponden a compras por concurso (NOG) y 19% a compras de baja cuantía o no sometidas a concurso (NPG).
- Del 18 de mayo al 02 de junio el monto adjudicado por eventos NOG pasó de Q 90.6 millones a Q 195.4 millones, es decir que se duplicó.
- El 38.9% de las compras publicadas como NPG no han cumplido con la publicación en Guatecompras dentro del plazo de diez días establecido en el Decreto Gubernativo 5-2020, esto es una barrera para la transparencia en la contratación y adquisición de bienes y servicios durante la crisis por COVID-19.
- Dentro de los eventos más significativos publicados por el MSPAS se encuentran: a) NOG 12568805 que busca la compra de 285 kit de 192 unidades de ensayo para detección de Sars-Covid-2 para uso del Laboratorio Nacional de Salud, este fue adjudicado el 20 de mayo por un monto de Q 20.2 millones a Productos Roche Guatemala, S.A; y, b) NPG E472502670 el cual publicó información sobre la adjudicación de un contrato por servicio de arrendamiento de habitaciones para albergar a pacientes leves o asintomáticos que resulten positivos a COVID-19 en el Área Metropolitana por un monto de Q 7.9 millones, esta compra no se publicó para concurso y fue adjudicado directamente a Valores Hoteleros, S.A. (Radisson Hotel and Suites), no se han publicado detalles del contenido del contrato suscrito en esta compra.
- El Departamento Administrativo es la unidad ejecutora del MSPAS con un mayor presupuesto (Q 266.8 millones) en el marco de la emergencia COVID-19, tiene a su cargo las compras y contrataciones del Hospital Temporal COVID-19 del Parque de la Industria, por lo cual es preocupante que: a) la cantidad de eventos publicados por esta unidad hayan disminuido notoriamente en mayo (publicó 11) y que todos estos eventos hayan sido anulados; b) no haya ningún evento vigente (en proceso de recepción de ofertas); y, c) los eventos en evaluación de ofertas corresponden a eventos que se encuentran en ese estado desde marzo o abril.

## 2. Recomendaciones

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:

- Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto en todas las compras realizadas por el MSPAS, a través de sus unidades ejecutoras, para lo cual, debe:
  - a) Asegurar que todas las compras que deban publicarse dentro del portal de Guatecompras como tipo NPG, cumplan con el plazo de 10 días establecidos

en el Decreto Gubernativo 5-2020, ratificado por Decreto 8-2020 del Congreso de la República.

- b) Publicar detalles generales (servicios que se incluyen, camas disponibles, etc.) del contrato por servicio de arrendamiento de habitaciones para albergar a pacientes leves o asintomáticos que resulten positivos a COVID-19 adjudicado a Valores Hoteleros, S.A., proceso de compra que se identifica en Guatecompras como NPG E472502670
- c) Instruir a que la mayor cantidad posible de las compras realizadas en el contexto de la emergencia se haga en la modalidad de concurso (cotización), permitiendo que se obtenga la oferta que mejor convengan a los intereses del Estado.

Se reiteran las recomendaciones a:

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,

- Dar la debida prioridad a una ejecución presupuestaria eficiente, eficaz, oportuna y transparente que asegure que los guatemaltecos puedan gozar de los servicios de salud, en condiciones de igualdad y sin discriminación, tomando en consideración a grupos con altos niveles de vulnerabilidad.
- Elaborar un inventario y diagnóstico, en caso este no exista, sobre las necesidades de corto y mediano plazo- de insumos, materiales, equipo y medicamentos de las diferentes unidades del MSPAS, en especial, de las Direcciones de Áreas de Salud y hospitales, y publicar dicha información; esto para garantizar la transparencia y acceso a la información de la población y permitir un mejor análisis de los esfuerzos de este ministerio para la prevención, atención y recuperación de las personas afectadas por el COVID-19.
- Tomar medidas inmediatas para determinar las razones por las que el Departamento Administrativo ha, prácticamente, paralizado la publicación y adjudicación de eventos de compra, así como instruir a que se realicen las compras y contrataciones que al Departamento Administrativo corresponden, especialmente como unidad ejecutora a cargo del centro de costo "Hospital Temporal COVID-19 Parque de la Industria".
- Realizar un análisis de las unidades ejecutoras que han presentado mayores dificultades para la ejecución de los procesos de compra y dar acompañamiento técnico a aquellas unidades, especialmente áreas de salud y hospitales, que así lo necesiten.

### 3. Seguimiento a ejecución de presupuesto

#### 3.1 Ejecución financiera

A casi tres meses de haberse declarado el estado de calamidad por la emergencia de COVID-19, que conllevó la correspondiente flexibilización en las normas de adquisiciones y contrataciones, y, a más de dos meses de que el Congreso de la República aprobó las ampliaciones presupuestarias para la atención de esta emergencia, la mayoría de las entidades aún reflejan bajas o nulas ejecuciones, aunque algunas ya empiezan a acelerar el proceso de ejecución, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

*Cuadro 1. Presupuesto vigente y ejecutado para emergencia COVID-19, según entidad*

| Entidades                                     | Vigente           | Ejecutado        | % ejecución |
|---|-------------------|------------------|-------------|
| MIDES   | Q6,461,836,000.0  | Q551,970,000.0   | 8.5%        |
| Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro    | Q3,250,000,000.0  | Q1,450,000,000.0 | 44.6%       |
| Municipalidades                               | Q204,915,081.9    | Q87,158,763.8    | 42.5%       |
| MINEDUC                                       | Q16,091,875.0     | Q1,675,738.0     | 10.4%       |
| Otras   | Q23,078,545.5     | Q2,111,732.9     | 9.2%        |
| SAT   | Q10,639,789.0     | Q804,747.0       | 7.6%        |
| MINECO  | Q2,400,000,000.0  | Q126,001,800.0   | 5.3%        |
| Secretaría y otras dependencias del Ejecutivo | Q10,922,589.0     | Q378,833.9       | 3.5%        |
| MSPAS   | Q1,675,823,755.0  | Q43,711,727.9    | 2.6%        |
| MINTRAB                                       | Q50,000,000.0     | Q1,064,000.0     | 2.1%        |
| MAGA  | Q400,000,000.0    | Q0.0             | 0.0%        |
| Total   | Q14,503,307,635.4 | Q2,264,877,343.4 | 15.6%       |


Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 5:12 am del 02 de junio de 2020.

De los Q 14,503.3 millones vigentes para la atención de esta emergencia, se han ejecutado Q 2,264.9 millones (15.6%), sin embargo, del total ejecutado, Q 1,450 millones (64.02%) corresponden a las transferencias realizadas al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), a través de *Obligaciones del Estado a cargo del tesoro*, los cuales corresponden al *Programa de Protección de Capitales*; la transferencia de estos fondos no representa que estos fondos hayan llegado a los destinatarios finales, únicamente representa que están a disponibilidad de CHN para ser utilizados en este programa.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), rector del sistema de salud y de la respuesta sanitaria a la emergencia, reporta una ejecución del 2.6% de los Q 1,675.8 millones con los que ahora cuenta para la atención de la emergencia. Tal como se observa en la siguiente gráfica, del total ejecutado por el Gobierno Central para la atención de la emergencia COVID-19, el 1.9% corresponde al MSPAS

#### Gráfica 1

*Distribución del presupuesto ejecutado en el marco de la emergencia COVID-19*

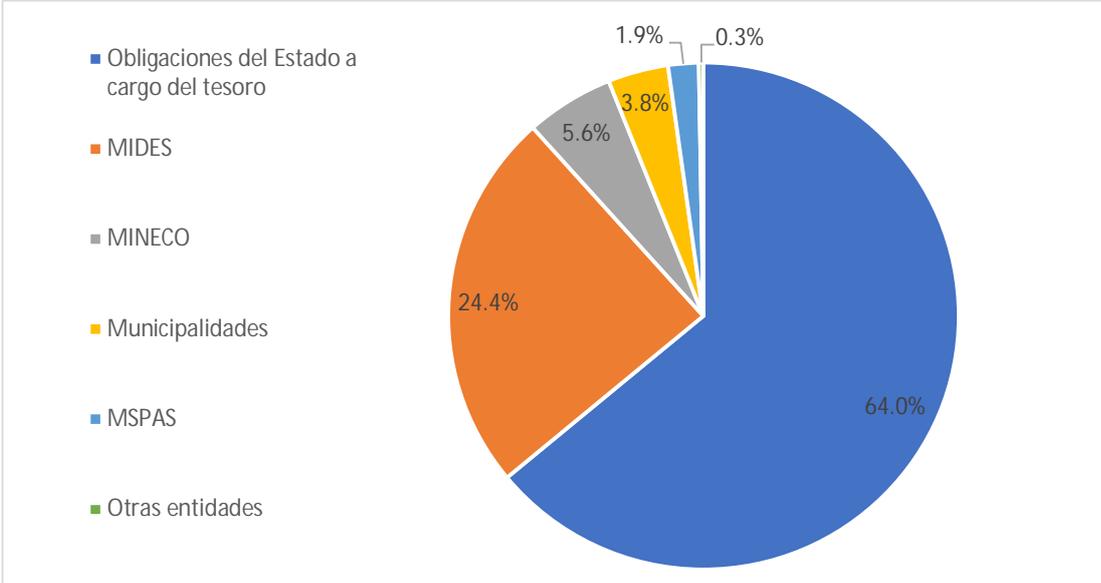

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 5:12 am del 02 de junio de 2020

Por otro lado, la ejecución de los programas relacionados con la asistencia económica por los efectos causados por la crisis COVID-19 a cargo del MIDES y MINECO ya muestran los primeros avances en la ejecución de los programas, aunque ninguno supera el 10%.

### 3.2 Ejecución física

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución física de los principales subproductos de los programas ejecutados por el Organismo Ejecutivo para atender la emergencia COVID-19.

*Cuadro 2. Ejecución física y financiera de principales programas de atención a emergencia COVID-19, según entidad y subproducto (Cifras de ejecución financiera en Quetzales)*

| Entidad | Subproducto  | Unidad de medida        | Presupuesto físico |           |        | Presupuesto financiero |              |        |
|---------|--|-------------------------|--------------------|-----------|--------|------------------------|--------------|--------|
|         |  |                         | Vigente            | Ejecutado | % Ejec | Vigente                | Ejecutado    | % Ejec |
| MIDES   | Intervenciones atención de emergencia  | Documento               | 12,506             | 0         | 0.0%   | 8,440,000              | 0            | 0.0%   |
|         | Bono de asistencia temporal  | Persona                 | 100,000            | 2,146     | 2.1%   | 100,000,000            | 35,000,000   | 35.0%  |
|         | Bono para familias   | Aporte                  | 6,000,000          | 516,970   | 8.6%   | 6,003,396,000          | 516,970,000  | 8.6%   |
|         | Bolsas de alimentos  | Persona                 | 500,000            | 0         | 0.0%   | 350,000,000            | 0            | 0.0%   |
| MINECO  | Bono para protección del empleo a trabajadores del sector privado              | Persona                 | 300,000            | 0         | 0.0%   | 2,000,000,000          | 126,001,800  | 6.3%   |
|         | MIPYME beneficiadas con créditos   | Entidad                 | 2,600              | 0         | 0.0%   | 400,000,000            | 0            | 0.0%   |
| MSPAS   | Intervenciones atención de emergencia  | Documento               | 6,427              | 65        | 1.0%   | 1,483,909,910          | 44,058,945.3 | 3.0%   |
|         | Laboratorios con material y equipo   | Análisis de laboratorio | 233,393            | 0         | 0.0%   | 191,913,845.00         | 0.0          | 0.0%   |
| MAGA    | Bolsas de alimentos  | Familia                 | 595,640            | 0         | 0.0%   | 350,000,000            | 0            | 0.0%   |
|         | Productores agropecuarios beneficiados con insumos para sistemas de mini riego | Familia                 | 5,048              | 0         | 0.0%   | 50,000,000             | 0            | 0.0%   |
| MINTRAB | Aporte económico entregado al adulto mayor                                     | Aporte                  | 125,000            | 0         | 0.0%   | 50,000,000             | 1,064,000    | 2.1%   |
| MINEDUC | Intervenciones atención de emergencia  | Documento               | 5,739,731          | 6         | 0.0%   | 16,091,875             | 1,678,166.0  | 10.4%  |

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN y SIGES, a las 15:10 horas del 01 de junio de 2020

Entre estos destaca el "*Bono familia*", que busca otorgar tres aportes de Q 1,000 a 2 millones de familias, a la fecha se registra una ejecución física del 8.6%, se debe tomar en cuenta que la entrega del primer aporte a la totalidad de las personas que busca cubrir este programa representaría una ejecución del 33%. Es positivo que el Bono de Asistencia Temporal (apoyo a sector informal), a cargo del MIDES, presente una ejecución financiera del 35%. En cuanto al "*Bono para protección del empleo para*

*trabajadores del sector privado*", a cargo del MINECO, registra una ejecución financiera del 6.3%, aunque aún no reporta ejecución física.

Por otro lado, los subproductos relacionados con asistencia alimentaria (bolsas de alimentos), a cargo del MIDES y el MAGA presentan ejecuciones físicas y financieras del 0%.

### 3.3 Ejecución presupuestaria del MSPAS y sus unidades ejecutoras


Tal como se mencionó anteriormente, el MSPAS a pesar de ser el ente rector de la respuesta sanitaria a la emergencia, solamente ha ejecutado el 2.6%<sup>1</sup> (Q 43.7 millones) de los Q 1,675.8 millones del presupuesto disponible para la atención de la emergencia, dentro del programa 94 y subprograma 9.

Según el SICOIN, el 28 de mayo de 2020 se registró la ampliación presupuestaria de Q 370 millones para el programa 94 del MSPAS, los cuales corresponden a la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso de la República a través del Decreto 20-2020.

En cuanto a la distribución del presupuesto del programa 94 en las distintas unidades ejecutoras, la mayoría se concentra en los hospitales (65.6%), seguido por las Direcciones de Áreas de Salud -DAS- (15.9%) y Departamento Administrativo (15.9%), este último tiene dentro de su presupuesto al Hospital Temporal del Parque de la Industria.

#### Gráfica 2

*Distribución del programa 94 del MSPAS en sus unidades ejecutoras (Cifras en millones de Q.)*

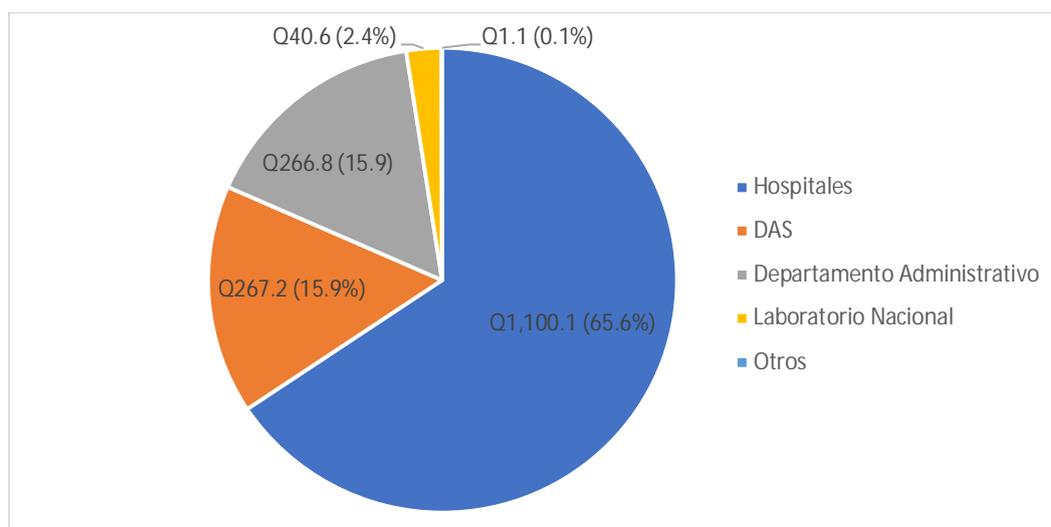

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN al 04 de junio de 2020.


En cuanto a la ejecución, se observa que esta es baja en la mayor parte de las unidades ejecutoras del MSPAS, tanto a nivel central (unidad ejecutora 201- Departamento Administrativo) como en las unidades descentralizadas (áreas de salud, hospitales, etc.). El Departamento Administrativo tiene una ejecución del 2.69% (Q 7.2 millones), las DAS 6.07% (Q 16.2 millones), los hospitales 1.83% (Q 20.1 millones) y el Laboratorio Nacional 0.27% (Q

<sup>1</sup> Tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 5:12 am del 02 de junio de 2020.

108,179). En la siguiente gráfica se observa como la mayoría de DAS y Hospitales aún reportan niveles de ejecución menores al 10%.

Gráfica 2

Ejecución presupuestaria de DAS y Hospitales, según rango de ejecución

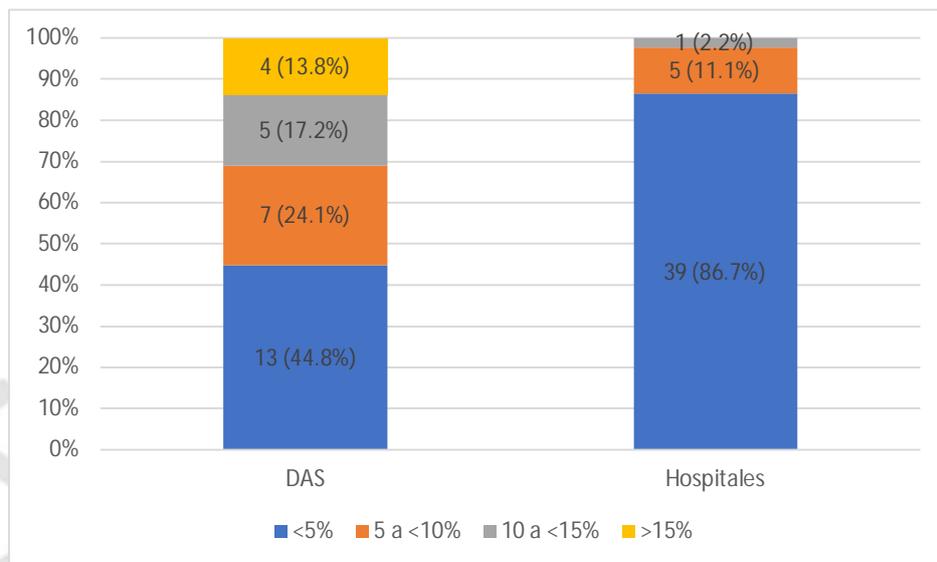

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 5:12 am del 02 de junio de 2020

En cuanto a los rubros en los que el MSPAS ha realizado la ejecución presupuestaria del programa 94, se tiene lo siguiente:

Cuadro 3. Presupuesto ejecutado por MSPAS en Programa 94 subprograma 9, según renglón

| Renglón | Devengado     | % respecto total |
|---------|---------------|------------------|
| 266     | Q18,687,322.8 | 42.2%            |
| 295     | Q13,984,207.1 | 31.6%            |
| 261     | Q2,620,323.2  | 5.9%             |
| 323     | Q1,629,251.7  | 3.7%             |
| 182     | Q1,612,903.2  | 3.6%             |
| 262     | Q1,590,639.2  | 3.6%             |
| 292     | Q970,162.2    | 2.2%             |
| 268     | Q758,728.0    | 1.7%             |
| 299     | Q539,135.5    | 1.2%             |
| 189     | Q426,000.0    | 1.0%             |
| 329     | Q296,193.0    | 0.7%             |

| Renglón         |   | Devengado     | % respecto total |
|-----------------|---|---------------|------------------|
| 325             | Equipo de transporte                        | Q207,440.0    | 0.5%             |
| 171             | Mantenimiento y reparación de edificios     | Q169,826.0    | 0.4%             |
| 243             | Productos de papel o cartón                 | Q167,222.0    | 0.4%             |
| 174             | Mantenimiento y reparación de instalaciones | Q132,441.3    | 0.3%             |
| 121             | Divulgación e información                   | Q100,499.2    | 0.2%             |
| Otros renglones |   | Q364,601.1    | 0.8%             |
| Total           |   | Q44,256,895.3 | 100.0%           |

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOION a las 14:59 horas del 02 de junio de 2020.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los cinco hospitales temporales, los cuales se encuentran adscritos a otras unidades ejecutoras, de los Q 513.2 millones del presupuesto que tienen vigente, solamente han ejecutado el 1.37%, tal como se muestra a continuación:

*Cuadro 4. Ejecución presupuestaria hospitales temporales COVID-19*

| Entidad                | Vigente         | Ejecutado     | % ejec. |
|------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Parque de la Industria | Q113,155,710.00 | Q2,962,972.20 | 2.60%   |
| Quetzaltenango         | Q104,561,609.00 | Q3,571,055.60 | 3.40%   |
| Petén                  | Q98,913,853.00  | Q. 0.0        | 0.00%   |
| Zacapa                 | Q98,224,853.00  | Q108,378.00   | 0.10%   |
| Escuintla              | Q98,313,853.00  | Q386,066.70   | 0.40%   |
| Total                  | Q513,169,878.00 | Q7,028,472.50 | 1.37%   |

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGES a las 15:02 horas del 2 de junio de 2020.

#### 4. Seguimiento a eventos de compra por excepción por emergencia COVID-19 del MSPAS

Al 02 de junio de 2020, el MSPAS había publicado 4,749 eventos de compra relacionadas con la emergencia COVID-19, de los cuales el 81% (3,846) corresponde a la publicación de concursos de compra (NOG) y el 19.01% (903) corresponde a eventos NPG<sup>2</sup>.

En cuanto a los eventos de concurso de adquisición (NOG) publicadas por el MSPAS, la situación es la siguiente:

##### *Cuadro 6*

##### *Estado de los eventos de compra NOG del MSPAS por emergencia COVID-19*

| Estatus       | Cantidad | Porcentajes |
|---------------|----------|-------------|
| Adjudicado    | 1,869    | 48.60%      |
| Anulado       | 915      | 23.80%      |
| Desierto      | 517      | 13.44%      |
| En evaluación | 441      | 11.47%      |
| Vigente       | 104      | 2.70%       |
| Total         | 3,846    | 100.00%     |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

En cuanto a las compras publicadas como NPG, de acuerdo con la información del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, el 38.9% (320) no han cumplido con la publicación en Guatecompras dentro del plazo de diez días establecido en el Decreto Gubernativo 5-2020<sup>3</sup>, esto es una barrera para la transparencia en la contratación y adquisición de bienes y servicios durante la crisis por COVID-19; además, podría tener implicaciones en la calidad del gatos: el promedio de días transcurridos entre la gestión de este tipo de compras y su publicación en Guatecompras es de 13 días.

<sup>2</sup> De acuerdo con Guatecompras, corresponden a eventos registrados dentro de los sistemas financieros administrativos del SIAF (Sistema de Gestión, Sistema de Contabilidad Integrada, Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales), que no están sometidos a procesos de concurso (cotización, licitación, etc.)

<sup>3</sup> El artículo 6 del Decreto Gubernativo 5-2020, ratificado por el Congreso de la República por Decreto 8-2020, establece que "Lo actuado y la documentación de respaldo en los procesos de compra y contratación de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión de trabajos que se realicen bajo el estado de calamidad pública, relacionado con el cumplimiento del objeto del presente Decreto Gubernativo, deberá publicarse en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de contratación o adquisición."

Por otro lado, entre ambos tipos de publicaciones de compra, se ha adjudicado un total de Q211.0 millones, más del 90% corresponde a compras publicadas como NOG.

*Cuadro 5*

*Monto adjudicado en compras del MSPAS relacionadas con la emergencia COVID-19, según tipo de publicación*

| Tipo de publicación | Monto adjudicado |
|---------------------|------------------|
| NOG                 | Q195,456,848.05  |
| NPG                 | Q15,507,505.17   |
| Total               | Q210,964,353.22  |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

Del monto total adjudicado, el 34.4% corresponde equipo o insumos para laboratorio, el 22.7% a equipo de protección, el 17.7% a equipo médico y el 10.2% a medicamentos, tal como se observa en el siguiente cuadro.

*Cuadro 6. Monto adjudicado por el MSPAS en compras relacionadas con la "Emergencia COVID-19", según tipo de producto*

| Tipo de producto   | Monto adjudicado | Porcentaje |
|--|------------------|------------|
| Equipo o insumos para laboratorio                        | Q72,528,638.9    | 34.4%      |
| Equipo de protección                                     | Q47,943,681.8    | 22.7%      |
| Equipo médico  | Q37,320,584.3    | 17.7%      |
| Medicamentos   | Q21,520,411.2    | 10.2%      |
| Productos o servicios de higiene                         | Q8,340,052.0     | 4.0%       |
| Hospedaje  | Q7,883,713.2     | 3.7%       |
| Material médico quirúrgico                               | Q6,753,598.0     | 3.2%       |
| Servicios médicos  | Q2,423,000.0     | 1.1%       |
| Remozamiento, reparación o mejoramiento de instalaciones | Q1,964,465.3     | 0.9%       |
| Combustible  | Q1,936,452.9     | 0.9%       |
| Transporte   | Q1,067,351.8     | 0.5%       |
| Alimentación   | Q804,705.1       | 0.4%       |
| Otros  | Q477,698.7       | 0.2%       |
| Total  | Q210,964,353.2   | 100.0%     |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

Por otro lado, el 16 de mayo de 2020, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) publicó el concurso para la adjudicación del Contrato Abierto 3-2020, con el NOG 12385220, evento

que fue solicitado por el MSPAS para la compra de equipo de protección para personal de salud. Este proceso es importante, pues de concretarse, permitiría agilizar en gran medida la adquisición de este tipo de insumos. El 26 de junio de 2020 se cierra la recepción de ofertas. El MINFIN ha invitado al público en general a participar como observadores en la apertura de plicas de este concurso.

En cuanto a las adjudicaciones, en el siguiente cuadro se presentan los diez eventos de compra adjudicados más significativos en términos monetarios, dentro de ellos se encuentra el NOG 12568805 que busca la compra de 285 kit de 192 unidades de ensayo para detección de sars-covid-2 para uso del Laboratorio Nacional de Salud, este fue adjudicado el 20 de mayo por un monto de Q 20.2 millones a Productos Roche Guatemala, S.A. También se encuentra el evento NPG E472502670, el cual contrató el servicio de arrendamiento de habitaciones para albergar a pacientes leves o asintomáticos que resulten positivos a covid-19 en el Área Metropolitana por un monto de Q 7.9 millones, esta compra no se publicó para concurso y fue adjudicado directamente a Valores Hoteleros, S.A. (Radisson Hotel and Suites), no se han publicado detalles del contenido del contrato suscrito en esta compra.

*Cuadro 7. Procesos de compra adjudicados por el MSPAS más significativos*

| NOG/NPG    | Descripción Concurso  | Unidad Compradora                     | Suma de Adjudicado (Q.) |
|------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 12568805   | Adquisición de kit de ensayo para detección de sars-covid-2 para uso del Laboratorio Nacional de Salud  | Laboratorio Nacional de Salud         | Q20,224,512.0           |
| 12291056   | Adquisición de equipo de imagenología   | Hospital Especializado de Villa Nueva | Q 8,021,710.0           |
| E472502670 | Servicio de arrendamiento de habitaciones para albergar a pacientes leves o asintomáticos que resulten positivos a covid-19 en el Área Metropolitana                    | Hospital Roosevelt                    | Q 7,883,713.2           |
| 12604216   | Adquisición de pruebas para detección de coronavirus sars-cov2, reacción en cadena de la polimerasa (pcr) y prueba para detección simultánea de patógenos respiratorios | Hospital de Cobán, Alta Verapaz       | Q 6,168,000.0           |
| 12542725   | Adquisición de guantes de nitrilo medianos, grandes y pequeños  | Hospital de San Benito                | Q 5,479,980.0           |
| 12374601   | Adquisición de útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio   | DAS Alta Verapaz                      | Q 5,431,080.0           |
| 12564591   | Adquisición de equipo médico para ventilación mecánica y monitorización   | Hospital de Cobán, Alta Verapaz       | Q 2,730,000.0           |


| NOG/NPG  | Descripción Concurso   | Unidad Compradora                             | Suma de Adjudicado (Q.) |
|----------|--|---|-------------------------|
| 12386294 | Adquisición pruebas para detección de coronavirus sars-cov2    | Departamento Administrativo                   | Q 2,592,000.0           |
| 12599697 | Adquisición de pruebas para detección de coronavirus sars-cov2 | Hospital de Cobán, Alta Verapaz               | Q 2,550,920.0           |
| 12285498 | Adquisición de equipo medico                                   | Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango | Q 2,447,950.0           |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

#### 4.1 Eventos de compra por unidad ejecutora del MSPAS

Tal como se mostró en el cuadro 6, el 23.8% de los eventos de compra publicados para concurso (NOG) han finalizado anulados, en la siguiente gráfica, se observa que este porcentaje es mayor en DAS y hospitales. En esa gráfica también se observa que los hospitales y DAS tienen un bajo porcentaje de eventos de compra con cotización en curso (vigentes o en evaluación), lo que se traducirá en pocas adjudicaciones en los próximos días.

Gráfica 3. Estado de eventos de compra publicados por el MSPAS en modalidad de excepción, según tipo de unidad ejecutora

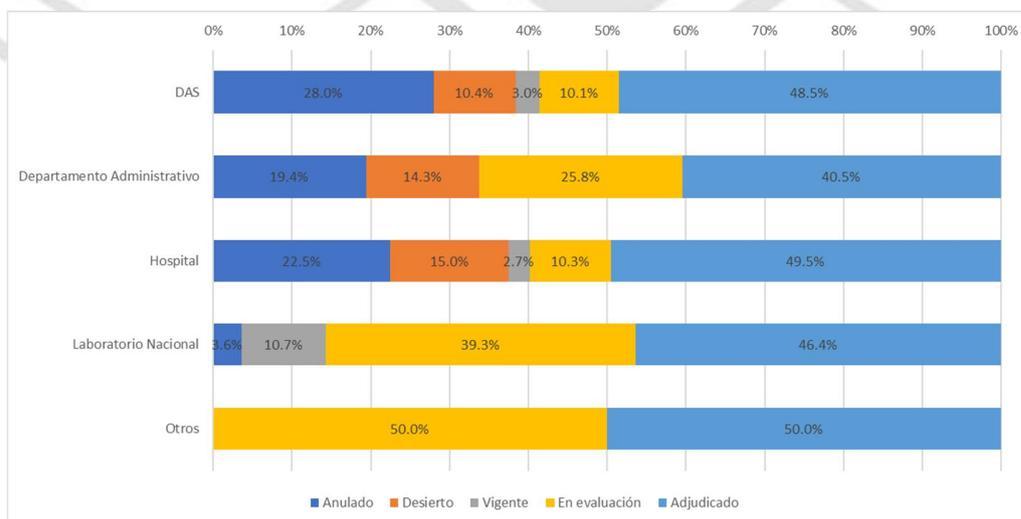


Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

En cuanto a los eventos adjudicados por tipo de unidad ejecutora, tal como se observa en la siguiente gráfica, el Departamento Administrativo continúa con un estancamiento en la adjudicación de compras, lo cual sucede desde la primera quincena de abril, en cuanto a los

hospitales y las DAS se observa un importante y sostenido incremento en los eventos de compra adjudicados durante el último mes.

Gráfica 4. Monto acumulado de adjudicaciones, según tipo de unidad ejecutora (en millones de Q.)

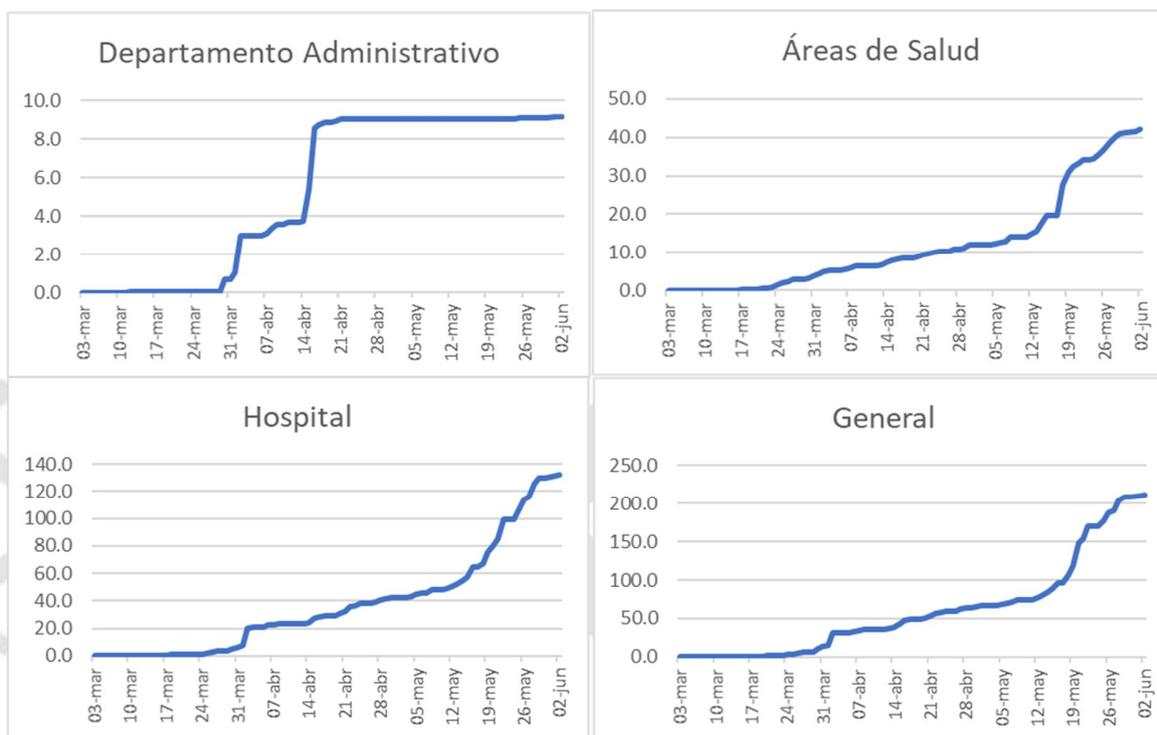

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

Tal como se ve en el anexo 2, las unidades ejecutoras que han adjudicado un mayor monto en eventos de compra son: el Laboratorio Nacional de Salud (Q 27.03 millones) el Hospital Regional de Occidente (Q 18 millones), Hospital Especializado de Villa Nueva (Q 16.9 millones), Hospital de Cobán (Q 14.4 millones), Hospital General San Juan de Dios (Q 13.4 millones) y Hospital Roosevelt (Q 13 millones).

#### 4.2 Departamento Administrativo MSPAS -unidad ejecutora 201-

El Departamento Administrativo es la unidad ejecutora del MSPAS con un mayor presupuesto (Q 266.8 millones) en el marco de la emergencia COVID-19, tiene a su cargo las compras y contrataciones del Hospital Temporal COVID-19 del Parque de la Industria. Por tal razón, es preocupante que la cantidad de eventos publicados por la unidad ejecutora 201 hayan disminuido notoriamente en mayo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Los 11 eventos NOG publicados en mayo por esta unidad finalizaron anulados.


Cuadro 8. Eventos publicados por el Departamento Administrativo del MSPAS

| Meses | NOG | NPG | Total |
|-------|-----|-----|-------|
| Marzo | 100 | 13  | 113   |
| Abril | 141 | 44  | 185   |
| Mayo  | 11  | 1   | 12    |
| Junio | 0   | 2   | 2     |
| Total | 252 | 60  | 312   |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

Es preocupante ver la parálisis, en términos de eventos de compra, en la que actualmente se encuentra el Departamento Administrativo del MSPAS. Desde el 20 de abril -fecha en que se denunció la existencia de la supuesta red de corrupción a lo interno del MSPAS- la cantidad de eventos NOG que se han publicado son pocos, actualmente no hay eventos vigentes.

Gráfica 5. Eventos de compra publicados por el Departamento Administrativo del MSPAS (acumulado)

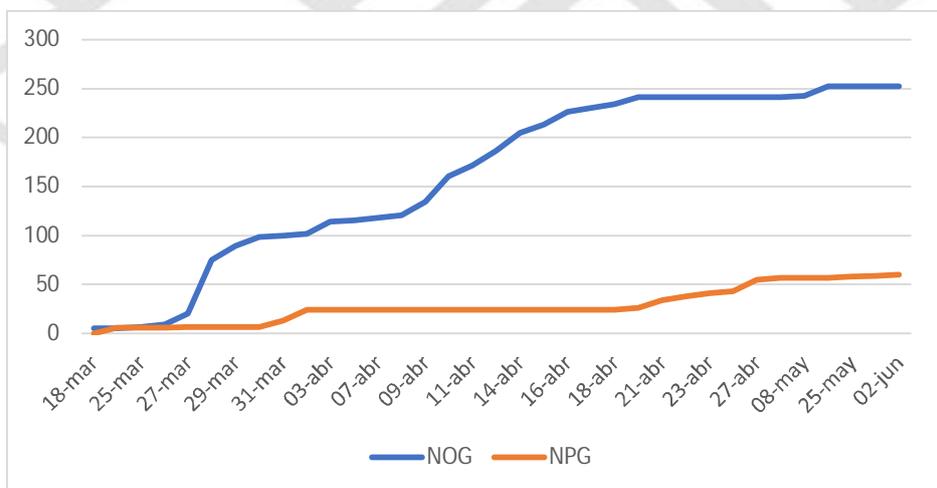

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020

Actualmente, el Departamento Administrativo no tiene ningún evento vigente, es decir que este requiriendo ofertas; los eventos que se encuentran en evaluación corresponden a eventos iniciados en marzo o abril, es decir tienen uno o dos meses de estar en ese estado. En mayo y primeros días de junio adjudicó dos eventos, por un monto total de Q 72 mil. Tal como se observa en la gráfica 4, desde mediados de abril el monto adjudicado por el Departamento Administrativo ha variado muy poco.

## Anexos

Anexo 1. Presupuesto vigente y ejecutado por el MSPAS para la atención de la "Emergencia COVID-19", según unidad ejecutora

| Código | Nombre UE   | Vigente        | Ejecutado    | % Ejec. |
|--------|---|----------------|--------------|---------|
| 201    | Departamento Administrativo   | 266,829,030.00 | 7,173,842.05 | 2.69    |
| 202    | Dirección de Área de Salud Guatemala Nor Oriente                    | 10,062,129.00  | 61,245.36    | 0.61    |
| 203    | Dirección de Área de Salud Guatemala Nor Occidente                  | 3,798,156.00   | 230,523.55   | 6.07    |
| 204    | Dirección de Área de Salud Guatemala Sur                            | 8,783,950.00   | 490,338.96   | 5.58    |
| 205    | Dirección de Área de Salud de El Progreso                           | 4,782,946.00   | 0.00         | 0.00    |
| 206    | Dirección de Área de Salud de Sacatepéquez                          | 4,899,158.00   | 68,310.00    | 1.39    |
| 207    | Dirección de Área de Salud de Chimaltenango                         | 13,932,960.00  | 790,342.50   | 5.67    |
| 208    | Dirección de Área de Salud de Escuintla                             | 12,268,634.00  | 233,800.00   | 1.91    |
| 209    | Dirección de Área de Salud de Santa Rosa                            | 16,236,084.00  | 545,455.62   | 3.36    |
| 210    | Dirección de Área de Salud de Sololá                                | 9,590,987.00   | 301,919.15   | 3.15    |
| 211    | Dirección de Área de Salud de Totonicapán                           | 7,837,371.00   | 645,377.20   | 8.23    |
| 212    | Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango                        | 6,639,986.00   | 699,792.22   | 10.54   |
| 213    | Dirección de Área de Salud de Suchitepéquez                         | 6,753,458.00   | 373,495.00   | 5.53    |
| 214    | Dirección de Área de Salud de Retalhuleu                            | 5,707,454.00   | 272,662.00   | 4.78    |
| 215    | Dirección de Área de Salud de San Marcos                            | 22,584,891.00  | 1,059,072.18 | 4.69    |
| 216    | Dirección de Área de Salud de Huehuetenango                         | 19,183,060.00  | 87,499.94    | 0.46    |
| 217    | Dirección de Área de Salud de Quiché                                | 16,965,656.00  | 507,049.70   | 2.99    |
| 218    | Dirección de Área de Salud de Ixcán                                 | 4,999,561.00   | 230,780.87   | 4.62    |
| 219    | Dirección de Área de Salud de Baja Verapaz                          | 11,354,086.00  | 1,629,608.20 | 14.35   |
| 220    | Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz                          | 21,346,139.00  | 0.00         | 0.00    |
| 221    | Dirección de Área de Salud de Petén Norte                           | 4,236,722.00   | 430,533.00   | 10.16   |
| 222    | Dirección de Área de Salud de Izabal                                | 5,093,597.00   | 745,594.04   | 14.64   |
| 223    | Dirección de Área de Salud de Zacapa                                | 3,879,591.00   | 287,240.24   | 7.40    |
| 224    | Dirección de Área de Salud de Chiquimula                            | 7,557,325.00   | 1,127,713.40 | 14.92   |
| 225    | Dirección de Área de Salud de Jalapa                                | 5,495,839.00   | 513,506.00   | 9.34    |
| 226    | Dirección de Área de Salud de Jutiapa                               | 12,773,623.00  | 2,008,618.50 | 15.72   |
| 227    | Hospital General San Juan de Dios                                   | 69,308,523.00  | 5,352,766.70 | 7.72    |
| 228    | Hospital de Salud Mental "Dr. Federico Mora"                        | 3,442,844.00   | 0.00         | 0.00    |
| 229    | Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación "Dr. Jorge Von Ahn" | 3,134,832.00   | 0.00         | 0.00    |
| 230    | Hospital Roosevelt  | 107,050,132.00 | 0.00         | 0.00    |
| 231    | Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación                  | 12,059,311.00  | 69,011.10    | 0.57    |
| 232    | Hospital "San Vicente"  | 5,604,651.00   | 78,058.40    | 1.39    |
| 233    | Hospital Nacional de Amatitlán                                      | 9,997,270.00   | 22,000.00    | 0.22    |
| 234    | Hospital de El Progreso   | 6,034,026.00   | 211,180.70   | 3.50    |
| 235    | Hospital Pedro de Bethancourt                                       | 15,755,293.00  | 62,515.00    | 0.40    |
| 236    | Hogar de Ancianos "Fray Rodrigo de La Cruz"                         | 886,780.00     | 53,200.60    | 6.00    |

| Código | Nombre UE   | Vigente        | Ejecutado    | % Ejec. |
|--------|---|----------------|--------------|---------|
| 237    | Hospital Nacional de Chimaltenango                                    | 11,610,920.00  | 0.00         | 0.00    |
| 238    | Hospital de Escuintla   | 119,813,866.00 | 567,066.70   | 0.47    |
| 239    | Hospital de Tiquisate   | 2,129,022.00   | 0.00         | 0.00    |
| 240    | Hospital Regional de Cuilapa "Licenciado Guillermo Fernández Llerena" | 23,773,772.00  | 580,649.00   | 2.44    |
| 241    | Hospital Departamental de Sololá                                      | 9,033,407.00   | 342,832.50   | 3.80    |
| 242    | Hospital Departamental de Totonicapán                                 | 19,993,348.00  | 337,464.80   | 1.69    |
| 243    | Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango                         | 134,664,319.00 | 3,692,486.91 | 2.74    |
| 244    | Hospital de Especialidades "Rodolfo Robles"                           | 7,277,541.00   | 34,500.00    | 0.47    |
| 245    | Hospital Nacional de Coatepeque                                       | 14,591,812.00  | 288,528.50   | 1.98    |
| 246    | Hospital de Mazatenango   | 11,028,326.00  | 277,721.35   | 2.52    |
| 247    | Hospital de Retalhuleu  | 13,134,847.00  | 795,932.05   | 6.06    |
| 248    | Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés Villagran Mazariegos"     | 8,293,505.00   | 0.00         | 0.00    |
| 249    | Hospital Nacional Malacatán, San Marcos                               | 11,725,440.00  | 928,039.15   | 7.91    |
| 250    | Hospital Regional de Huehuetenango "Dr. Jorge Vides Molina"           | 15,931,474.00  | 0.00         | 0.00    |
| 251    | Hospital Nacional de San Pedro Necta                                  | 2,951,617.00   | 146,711.20   | 4.97    |
| 252    | Hospital Regional de El Quiché  | 12,012,585.00  | 550,045.92   | 4.58    |
| 253    | Hospital Nacional de Salamá   | 5,737,681.00   | 166,223.08   | 2.90    |
| 254    | Hospital Regional de Cobán  | 20,558,279.00  | 0.00         | 0.00    |
| 255    | Hospital de San Benito  | 120,044,351.00 | 58,481.78    | 0.05    |
| 256    | Hospital de Melchor de Mencos   | 5,107,289.00   | 138,009.00   | 2.70    |
| 257    | Hospital Distrital Sayaxché, Petén                                    | 3,241,876.00   | 469,172.93   | 14.47   |
| 258    | Hospital de Poptún  | 4,997,852.00   | 137,623.96   | 2.75    |
| 259    | Hospital de La Amistad Japón Guatemala                                | 15,743,506.00  | 71,531.00    | 0.45    |
| 260    | Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez", Puerto Barrios, Izabal   | 8,100,821.00   | 16,000.00    | 0.20    |
| 261    | Hospital Regional de Zacapa   | 116,299,338.00 | 1,378,967.01 | 1.19    |
| 262    | Hospital de Chiquimula  | 19,328,478.00  | 236,690.30   | 1.22    |
| 263    | Hospital Nacional "Nicolasa Cruz" Jalapa                              | 6,028,904.00   | 0.00         | 0.00    |
| 264    | Hospital Nacional "Ernestina García Vda. de Recinos"                  | 8,644,391.00   | 420,182.80   | 4.86    |
| 265    | Dirección de Área de Salud de Petén Sur Occidente                     | 2,478,622.00   | 931,982.50   | 37.60   |
| 266    | Dirección de Área de Salud de Petén Suroriente                        | 8,458,699.00   | 0.00         | 0.00    |
| 267    | Hospital de Joyabaj   | 4,589,833.00   | 0.00         | 0.00    |
| 268    | Hospital de Nebaj   | 4,298,590.00   | 71,937.50    | 1.67    |
| 269    | Hospital de Uspantán  | 4,156,559.00   | 136,495.00   | 3.28    |
| 270    | Hospital Fray Bartolomé de Las Casas                                  | 7,483,335.00   | 28,084.00    | 0.38    |
| 271    | Hospital de La Tinta  | 4,292,229.00   | 0.00         | 0.00    |
| 272    | Escuela Nacional de Enfermeras  | 165,100.00     | 27,318.00    | 16.55   |
| 274    | Escuela Nacional de Enfermería de Occidente                           | 40,000.00      | 0.00         | 0.00    |
| 276    | Escuela Para Auxiliares de Enfermería de Oriente                      | 5,000.00       | 0.00         | 0.00    |
| 278    | Dirección de Área de Salud Guatemala Central                          | 5,839,124.00   | 1,085,766.16 | 18.59   |
| 280    | Laboratorio Nacional de Salud   | 40,636,766.00  | 108,178.80   | 0.27    |

| Código | Nombre UE                                      | Vigente       | Ejecutado    | % Ejec. |
|--------|--|---------------|--------------|---------|
| 283    | Dirección de Área de Salud Ixil                | 3,658,255.00  | 869,514.13   | 23.77   |
| 284    | Hospital de Barillas                           | 6,082,622.00  | 434,285.11   | 7.14    |
| 285    | Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva | 81,897,614.00 | 1,865,261.78 | 2.28    |
| 287    | Hospital General Tipo I de Tecpán Guatemala    | 3,076,785.00  | 154,992.82   | 5.04    |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 5:12 am del 02 de junio de 2020

Anexo 2. Eventos publicados y adjudicados por el MSPAS para la atención de la "Emergencia COVID-19", según unidad ejecutora

| Unidad Compradora  | Monto adjudicado | % respecto total MSPAS |
|--|------------------|------------------------|
| LABORATORIO NACIONAL DE SALUD  | Q27,034,911.9    | 12.8%                  |
| HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO                        | Q17,969,255.6    | 8.5%                   |
| HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA                       | Q16,881,352.3    | 8.0%                   |
| HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ                                      | Q14,450,812.6    | 6.8%                   |
| HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS                                    | Q13,456,089.9    | 6.4%                   |
| HOSPITAL ROOSEVELT   | Q12,983,397.7    | 6.2%                   |
| HOSPITAL DE SAN BENITO   | Q9,209,724.2     | 4.4%                   |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  | Q9,201,580.3     | 4.4%                   |
| DIRECCION DE AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ                           | Q7,197,381.3     | 3.4%                   |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA  | Q5,655,566.2     | 2.7%                   |
| DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SAN MARCOS                             | Q4,883,608.5     | 2.3%                   |
| HOSPITAL DE ESCUINTLA  | Q3,824,342.6     | 1.8%                   |
| HOSPITAL DE CUILAPA  | Q3,822,221.2     | 1.8%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE SAN MARCOS, ""DR. MOISES VILLAGRAN MAZARIEGOS"" | Q3,747,804.9     | 1.8%                   |
| HOSPITAL DE RETALHULEU   | Q3,465,912.4     | 1.6%                   |
| HOSPITAL REGIONAL DE EL QUICHÉ                                       | Q2,997,351.1     | 1.4%                   |
| AREA DE SALUD DE ESCUINTLA   | Q2,668,967.4     | 1.3%                   |
| HOSPITAL DE PUERTO BARRIOS   | Q2,474,595.2     | 1.2%                   |
| AREA DE SALUD GUATEMALA CENTRAL                                      | Q2,276,399.4     | 1.1%                   |
| DIRECCION AREA DE SALUD DE CHIQUIMULA                                | Q2,185,200.2     | 1.0%                   |
| AREA DE SALUD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ                                | Q2,141,109.3     | 1.0%                   |
| AREA DE SALUD DE CHIMALTENANGO                                       | Q1,898,321.8     | 0.9%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO                                   | Q1,795,520.0     | 0.9%                   |
| HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN                            | Q1,669,313.9     | 0.8%                   |
| AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO                                       | Q1,659,534.5     | 0.8%                   |
| DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE JUTIAPA                                | Q1,644,916.5     | 0.8%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA                                      | Q1,418,055.0     | 0.7%                   |
| AREA DE SALUD DE IZABAL  | Q1,255,893.0     | 0.6%                   |
| HOSPITAL NACIONAL MALACATÁN SAN MARCOS                               | Q1,250,762.5     | 0.6%                   |
| DIRECCION DE AREA DE SALUD GUATEMALA SUR                             | Q1,200,243.6     | 0.6%                   |
| HOSPITAL DISTRITAL, POPTÚN, PETEN,                                   | Q1,166,623.3     | 0.6%                   |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ                                     | Q1,100,663.2     | 0.5%                   |
| DIRECCION AREA DE SALUD IXIL   | Q1,051,754.1     | 0.5%                   |
| AREA DE SALUD DE ZACAPA  | Q1,031,424.6     | 0.5%                   |
| DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN SUR OCCIDENTE                    | Q1,028,275.7     | 0.5%                   |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN                                | Q956,854.5       | 0.5%                   |
| AREA DE SALUD DE IXCAN   | Q955,957.1       | 0.5%                   |
| DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JALAPA                                 | Q935,772.8       | 0.4%                   |
| HOSPITAL DE SAN VICENTE  | Q929,157.0       | 0.4%                   |
| AREA DE SALUD DE QUICHE  | Q875,956.0       | 0.4%                   |
| AREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO                                      | Q873,574.0       | 0.4%                   |

| Unidad Compradora   | Monto adjudicado | % respecto total MSPAS |
|---|------------------|------------------------|
| AREA DE SALUD DE SUCHITEPEQUEZ                                    | Q873,071.0       | 0.4%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RODOLFO ROBLES                           | Q863,798.5       | 0.4%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE                                   | Q829,352.5       | 0.4%                   |
| AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE                               | Q824,968.7       | 0.4%                   |
| HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE                                       | Q817,205.9       | 0.4%                   |
| HOSPITAL DISTRITAL DE BARRILLAS                                   | Q812,143.9       | 0.4%                   |
| DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN NORTE                         | Q732,230.5       | 0.3%                   |
| AREA DE SALUD SANTA ROSA  | Q701,391.8       | 0.3%                   |
| HOSPITAL DE NEBAJ   | Q698,924.3       | 0.3%                   |
| AREA DE SALUD DE TOTONICAPAN                                      | Q697,468.0       | 0.3%                   |
| DIRECCION AREA DE SALUD DE SACATEPEQUEZ                           | Q686,075.0       | 0.3%                   |
| HOSPITAL DE MAZATENANGO   | Q637,806.9       | 0.3%                   |
| HOSPITAL REGIONAL DE HUEHUETENANGO ""DR. JORGE VIDES MOLINA""     | Q637,305.4       | 0.3%                   |
| HOSPITAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ                                  | Q622,295.8       | 0.3%                   |
| HOSPITAL DE TIQUISATE   | Q591,388.0       | 0.3%                   |
| AREA DE SALUD PETEN SUR-ORIENTE                                   | Q572,511.0       | 0.3%                   |
| HOSPITAL NACIONAL ERNESTINA GARCIA VDA. DE RECINOS                | Q559,498.0       | 0.3%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLÁN                                    | Q500,410.0       | 0.2%                   |
| AREA DE SALUD RETALHULEU  | Q493,150.0       | 0.2%                   |
| HOSPITAL DE EL PROGRESO   | Q492,308.6       | 0.2%                   |
| HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT                                     | Q486,165.0       | 0.2%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA                              | Q445,062.8       | 0.2%                   |
| HOSPITAL DE USPANTAN  | Q405,994.1       | 0.2%                   |
| HOSPITAL NACIONAL MELCHOR DE MENCOS                               | Q381,874.1       | 0.2%                   |
| DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE                | Q352,501.6       | 0.2%                   |
| HOSPITAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS                              | Q335,131.0       | 0.2%                   |
| HOSPITAL NACIONAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ, PUERTO BARRIOS, IZABAL | Q326,920.5       | 0.2%                   |
| HOSPITAL DE SALUD MENTAL ""DR. FEDERICO MORA""                    | Q286,494.8       | 0.1%                   |
| DIRECCION DE AREA DE SALUD DE EL PROGRESO                         | Q260,304.5       | 0.1%                   |
| HOSPITAL DE LA TINTA  | Q240,850.8       | 0.1%                   |
| HOSPITAL GENERAL TIPO I DE TECPAN GUATEMALA                       | Q154,992.8       | 0.1%                   |
| DIRECCION DE AREA DE SALUD DE SOLOLA                              | Q151,668.8       | 0.1%                   |
| HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ, JALAPA                           | Q76,155.0        | 0.0%                   |
| HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN | Q72,150.0        | 0.0%                   |
| HOGAR FRAY RODRIGO DE LA CRUZ                                     | Q71,200.0        | 0.0%                   |
| ESCUELA FORMADORAS EN LA CAPITAL                                  | Q27,318.0        | 0.0%                   |
| HOSPITAL DISTRITAL DE JOYABAJ                                     | Q16,000.0        | 0.0%                   |
| CEMENTERIOS NACIONALES  | Q4,109.0         | 0.0%                   |
| Total   | Q210,964,353.2   | 100.0%                 |

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 1:07 pm del 02 de junio de 2020
